
AUROB · FERTIGUNGSHALLE · NEUE PLANUNG · STAND 09.11.2026

Neue Hallenplanung mit UMC-500

Reihenfolge von hinten nach vorne: VF-2SS, VM-2, UMC-500, Hermle am Tor. Draufsicht und Ansicht im Maßstab.

Draufsicht

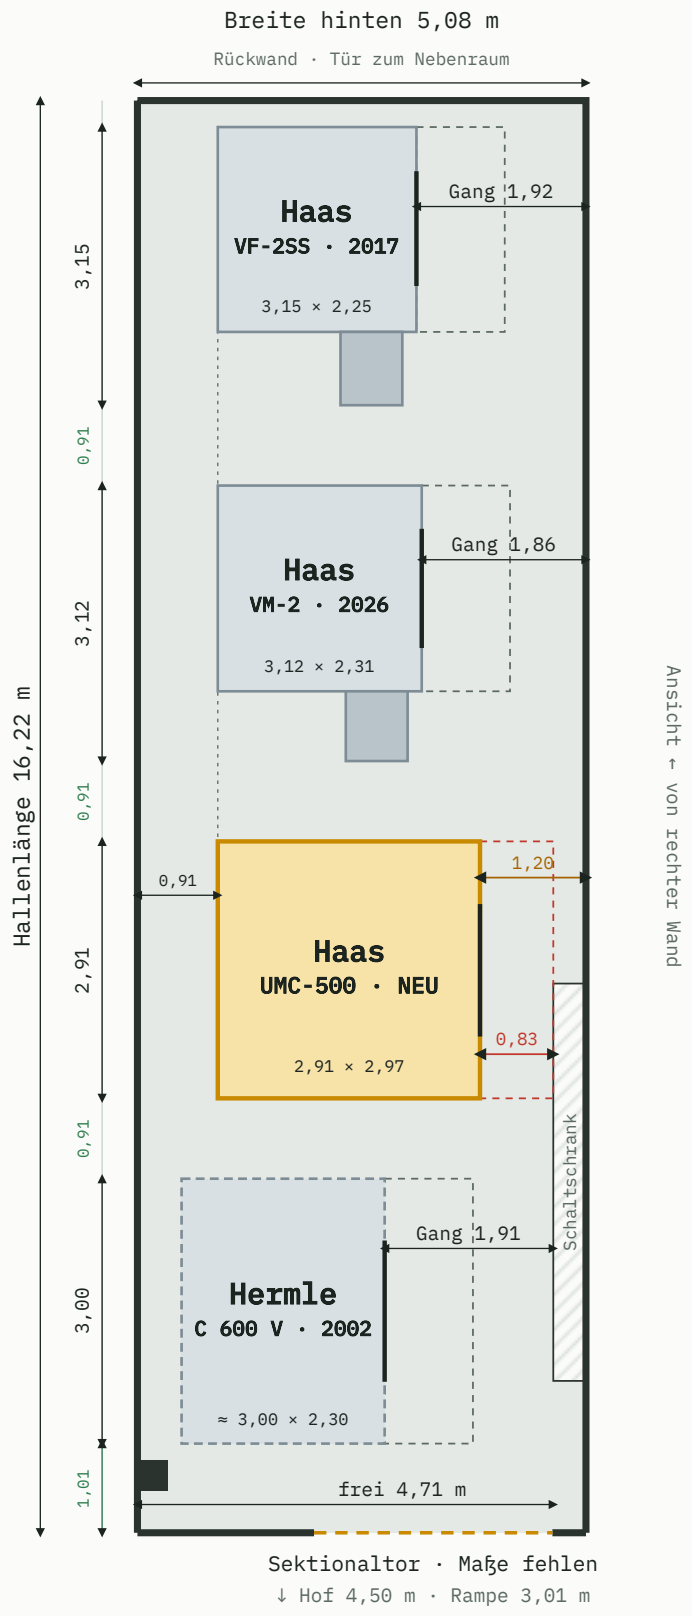

Bestand · UMC-500 neu · Späneförderer · Bedienzone 1,0 m · Bedienseite

Maße in m: Breite entlang der Wand × Tiefe. Haas-Maschinen 0,91 m vor der Wand und 0,91 m Abstand untereinander (Haas-Wartungsabstand). Hermle ohne Layoutplan. Schaltschrank und Säule geschätzt.

Ergebnis

PASST **Länge an der Wand**
Die vier Maschinen brauchen 12,18 m. Mit 0,91 m Abstand nach Haas sind es 15,21 m. Vor dem Tor bleiben 1,01 m.

PASST **Höhe**
Alle Maschinen bleiben unter 3,05 m. Die UMC-500 ist 2,62 m hoch. Am knappsten ist der Kabelschlepp der VM-2 mit 2,996 m.

KRITISCH **Gang an der UMC-500**
Haas gibt 2,97 m Tiefe an. Mit 0,91 m Wandabstand bleiben 1,20 m Gang. Am Schaltschrank rechts bleiben nur 0,83 m.

PASST **Gänge an VF-2SS, VM-2, Hermle**
1,92 m, 1,86 m und 1,91 m. Das reicht zum Bedienen.

OFFEN **Transport UMC-500**
Exportpalette 3,25 × 2,34 × 2,57 m, ca. 5,4 t. Durch die Rampe nur mit der 2,34-m-Seite quer. Tormaße fehlen.

Maschinenmaße

MASCHINE	BREITE	TIEFE	HÖHE BETRIEB	MAX. HÖHE	QUELLE
Haas VF-2SS	3,147 m	2,249 m	2,724 m	2,724 m	Haas MLD 01/2023
Haas VM-2	3,116 m	2,311 m	2,733 m	2,996 m	Haas MLD 11/2021
Haas UMC-500	2,912 m	2,965 m	2,616 m	2,616 m	Haas MLD 07/2019 (Suchauszug)
Hermle C 600 V	3,00 m	2,30 m	2,70 m	–	Inserate, Schätzung


VF-2SS und VM-2: Breite mit Späneförderer. UMC-500: Spänauswurf in 0,99 m Höhe. Die Zuordnung von Breite und Tiefe stammt aus einem Textauszug des Haas-Plans. Bitte mit dem PDF prüfen.

UMC-500 Transport (Händlerangaben)

VARIANTE	LÄNGE	BREITE	HÖHE
Exportpalette	3,25 m	2,34 m	2,57 m
Inlandspalette	3,25 m	2,49 m	2,79 m
Gewicht	ca. 5,4 t (je nach Ausstattung bis 6,1 t)		

Ansicht von der rechten Wand

Du stehst an der rechten Wand. Alle Maschinen zeigen mit der Front zu dir. Das Tor ist links.

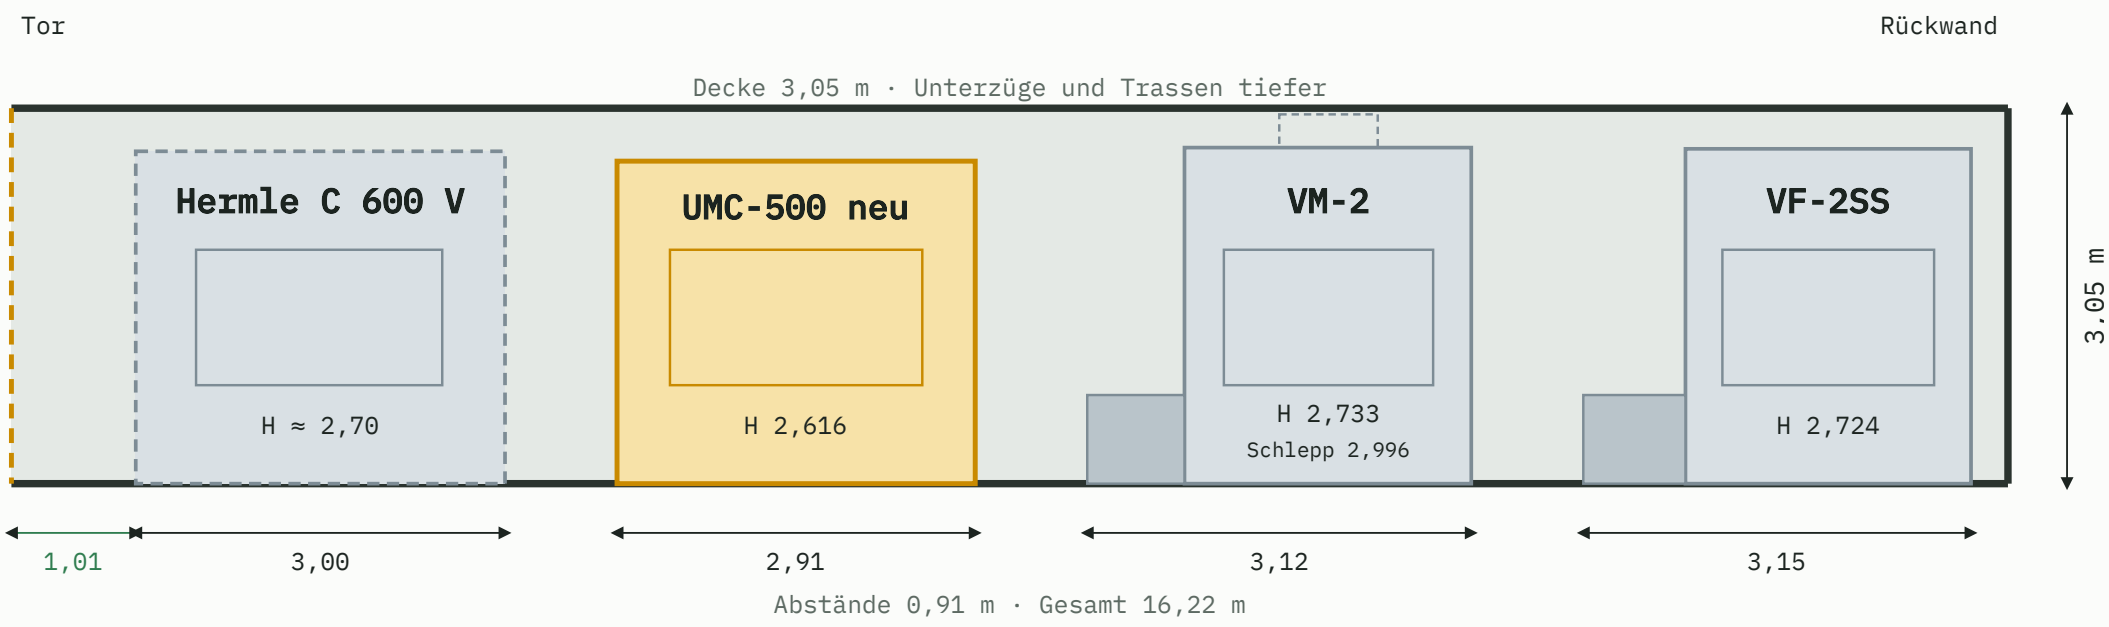

Reihenfolge beim Umstellen

1. Fahr die Hermle aus dem hinteren Bereich. Stell sie vorübergehend vorne oder draußen ab.
2. Stell die VF-2SS ganz nach hinten.
3. Stell die VM-2 direkt daneben.
4. Bring die UMC-500 ein und stell sie neben die VM-2.
5. Stell die Hermle zuletzt vorne am Tor auf.

Grund: Jede Maschine muss am Gang vorbei. Hinten zuerst, dann blockiert keine Maschine den Weg.

Das fehlt noch

1. Lad mir den Haas-Layoutplan der UMC-500 hoch. Dann prüfe ich Breite und Tiefe genau.
2. Miss, wo der Schaltschrank rechts genau steht. Davon hängt der Gang an der UMC-500 ab.
3. Miss das Tor zur Halle: lichte Breite und lichte Höhe.
4. Miss die Hermle: Breite, Tiefe, Höhe.
5. Prüf die Säule links vorne neben der Hermle.

Quellen: Haas Machine Layout Drawings VF-2/VF-2SS (01/2023), VM-2 (11/2021), UMC-500 (07/2019, Suchauszug). UMC-500 Transport, Gewicht und Hermle: Händlerinserate.
